

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 41/42 (1903)
Heft: 7

Artikel: Simplon-Tunnel
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-23958>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 13.03.2025


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Wettbewerb zur Erlangung von Mosaikbildern im Hofe des Landesmuseums in Zürich.

(Mit einer Tafel.)

II.

Joh. Bossard aus Zug, dessen Arbeiten, wie vom Preisgericht ausdrücklich hervorgehoben wird, allein „einen ausgesprochen schweizerischen Charakter zur Schau tragen“, hat sich folgende Themen zur Ausführung gewählt: Manesse, den Bundesschwur, Niklaus von der Flüe, die Luzerner Mordnacht, sowie den Kampf bei Näfels und hat von dieser letzteren Skizze Proben in Fünftels- und Originalgrösse hergestellt. Die Bilder sind auffallend verschiedenwertig; fast alle Entwürfe aber entbehren der Monumentalität und klaren Uebersichtlichkeit; eine grössere Einfachheit würde die Schöpfungen schlichter und zugleich eindrucksvoller gestalten. Dazu sind die Kompositionen des Bundesschwures und der Friedensstiftung durch Niklaus von der Flüe recht wenig originelle Arbeiten und die Art, wie auf dem letzteren Bilde die Hauptfigur aus der Mitte verdrängt ist, muss fast als ungeschickt bezeichnet werden. Auf die zumeist nicht besonders glückliche Farbengebung soll nicht eingegangen werden, da *Bossard* selbst ausdrücklich betont, dass er die bereits ausgeführten Mosaiken nicht gesehen habe, seine Arbeiten demnach auch keinen Anspruch darauf machen

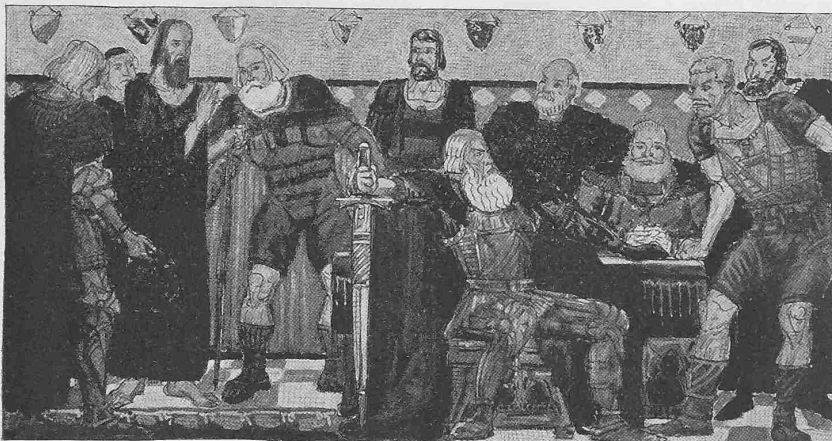

Niklaus von der Flüe in Stans. — Entwurf von *Joh. Bossard* aus Zug.

könnten in dieser Beziehung mit denen Sandreuters zusammenstimmen. Auch die formelle Durchführung lässt manches zu wünschen übrig und die bei den Szenen aus der Luzerner Historie und aus Niklaus von der Flües Leben beliebte, groteske Charakteristik der einzelnen Persönlichkeiten nimmt diesen Bildern beinahe den nötigen Ernst. Weitaus der beste Entwurf ist die Näfeler Schlachtszene, in der das derbe Schweizer Fussvolk mit elementarer Kraft gegen die schwarz geharnischten Ritter anstürmt. Man sieht und fühlt die Unüberwindbarkeit dieser gewaltigen Männer und dieses unmittelbare Sprechen des Bildes zum Beschauer ist der nachdrücklichste Beweis für seine Vorzüglichkeit. So hat *Bossard* bewiesen, dass sein entschiedenes Talent energische und temperamentvolle Leistungen mit einem eigenen, heimatlichen Gepräge ermöglicht, die ihn bei noch grösserer Berücksichtigung der vorhandenen Bilder und einiger Enthaltsamkeit in der allzu scharfen Charakteristik der unbändigen Kraft seiner Schweizer vielleicht am meisten zur Fortsetzung der Mosaiken befähigen. (Schluss folgt.)

Simplon-Tunnel.

Der das letzte Quartal des Jahres 1902 umfassende *siebzehnte Vierteljahresbericht* über den Stand der Arbeiten am Simplon-Tunnel, vom 24. Januar datiert, ist soeben erschienen. Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 1902 hat auf der *Nordseite* der Fortschritt im Richtstollen des Haupt-




Der Bundesschwur. — Entwurf von *Joh. Bossard* aus Zug.

tunnels 581 m, im Parallelstollen 511 m und im Firststollen 454 m tragen; die entsprechenden Stollen der *Südseite* sind um 498 m, 507 m und 304 m gefördert worden. Der Vollausschub ist auf der *Nordseite* um 453 m, auf der *Südseite* um 328 m fortgeschritten. Als Gesamtleistung im Berichtsquartal werden angegeben auf der *Brieger Seite*:

Aushub 22 270 m³, Mauerwerk 532 m (5 284 m³), auf der *Seite von Iselle*: Aushub 20 812 m³ und Mauerwerk 312 m (4 812 m³). In der Tabelle I (S. 80) sind, nach Arbeitsgattungen geordnet, die seit Baubeginn je bis zum Anfange und Schlusse des Berichtsvierteljahres erzielten Gesamtleistungen zusammengestellt.

Der mittlere Stollenquerschnitt für die drei Monate wird auf der *Nordseite* für den Richtstollen mit 5,9 m², für den Parallelstollen mit 6,0 m² angegeben, in den entsprechenden Stollen der *Südseite* betrug derselbe 5,6 m² bzw. 5,8 m². In den beiden Stollen arbeiteten durchschnittlich auf der *Briegerseite* je drei Bohrmaschinen während 89 Tagen, auf der *Seite von Iselle* je 3,1 Bohrmaschinen im Richtstollen während 89 Tagen und im Parallelstollen während 111,5 Tagen. Die Gesamtzahl der Bohrangriffe betrug in beiden Stollen zusammen *nordwärts* 852 und *südwärts* 1038. Mittels mechanischer Bohrung wurden im ganzen aus den vier Stollen 12 121 m³ Material gefördert, wozu 58 622 kg Dynamit und 89 156 Arbeitsstunden verwendet worden sind. Von letzteren entfallen 4390,3 Stunden auf die eigentliche Bohrarbeit und 4525,3 Stunden auf das Laden der Schüsse und die Schutterarbeit.

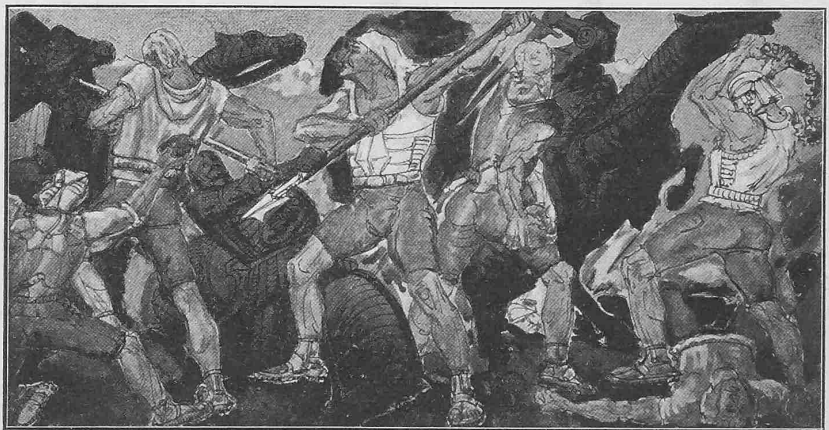

Die Schlacht bei Näfels. — Entwurf von *Joh. Bossard* aus Zug.

Durch Handbohrung wurde auf beiden Tunnelseiten zusammen 29 136 m³ Aushub bewirkt mit einem Aufwand von 22 264 kg Dynamit und 99 739 Arbeiter-Tagschichten.

Während der drei Monate belief sich die Arbeiterzahl durchschnittlich auf:

| | Nordseite | Südseite | Zusammen |
|------------------------|-----------|----------|----------|
| Im Tunnel | 1033 | 1167 | 2200 |
| Ausserhalb des Tunnels | 435 | 436 | 871 |
| Zusammen | 1468 | 1603 | 3071 |

gegen 3062 im vorhergehenden Vierteljahr. Die grösste Anzahl der gleichzeitig im Tunnel beschäftigten Arbeiter wird für die Nordseite mit 410 und für die Südseite mit 490 angegeben.

Tabelle I.

| Gesamtlänge des Tunnels 1929 m | Nordseite-Brieg | | Südseite-Iselle | | Total | |
|--|-----------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-----------|
| | Sept. 1902 | Dez. 1902 | Sept. 1902 | Dez. 1902 | Sept. 1902 | Dez. 1902 |
| Stand der Arbeiten Ende . . . | | | | | | |
| Sohlenstollen im Haupttunnel . . m | 7888 | 8469 | 5361 | 5859 | 13249 | 14328 |
| Parallelstollen m | 7796 | 8307 | 5296 | 5803 | 13092 | 14110 |
| Firststollen m | 7187 | 7641 | 4631 | 4935 | 11818 | 12576 |
| Fertiger Abbau m | 7158 | 7611 | 4575 | 4903 | 11733 | 12514 |
| Gesamtausbruch m ² | 337613 | 359883 | 221904 | 242716 | 559517 | 602599 |
| Verkleidung, Länge m | 6896 | 7428 | 4335 | 4647 | 11231 | 12075 |
| Verkleidungsmauerwerk m ³ | 69075 | 74359 | 45219 | 50031 | 114294 | 120390 |

Geologische Verhältnisse.

Auf der Nordseite lag der Richtstollen bei Km. 7,888 in weissem Monte-Leone-Gneiss, mehrfach mit granitführenden Schichten durchsetzt. Weiterhin wechselte der weisse Gneiss ab mit solchem, der durch reichere Glimmerbeimengung grau gefärbt und von größerem Korn war. Bei Km. 8,145 ändert sich das Gestein plötzlich. Auf den schieferigen grauen Gneiss folgt weisser, kalkhaltiger Quarzit mit vielen, wasserführenden Rissen der allmählich in weissen, körnigen Marmor übergeht. Diese Einlagerung hat eine Mächtigkeit von etwa 10 m, worauf kalkreiche, glimmerhaltige Schiefer folgen. Nach Unterbrechung durch eine zweite, nur 1 m mächtige, ebenfalls wasserführende Quarzitbank, werden diese Schiefer weicher und nötigten zu sehr kräftigem Holzeinbau. Sie nehmen allmählich wieder mehr gneissähnlichen Charakter an und sind bis zu Km. 8,290 sehr arm an Quarz. Von hier bis zu Km. 8,469 folgen helle, perlgraue oder grünlichgraue Glimmerschiefer mit Einsprengungen von schwarzem Glimmer. Dieselben sind fast identisch mit dem auf der Süd-

Die Waschanstalt Union in Davos.

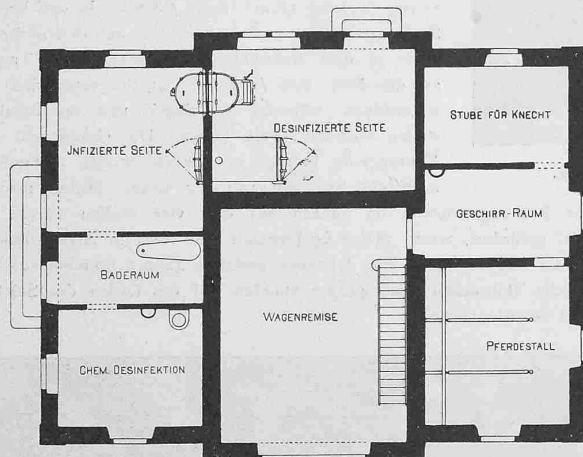


Abb. 12. Das Desinfektions- und Stallgebäude. Grundriss. — 1 : 200.

seite von Km. 4,436 bis Km. 4,500 mitten in dem zertrümmerten Kalkschiefer angetroffenen Gestein. Der Gehalt der Quellen weist bei dieser Schicht auch für die Nordseite auf die Nachbarschaft von Anhydrit und Gipslager hin. Die Natur des Gesteins hat somit vollkommen geändert und diese zu beiden Seiten des Tunnels gemachten Erfahrungen lassen darauf schliessen, dass auf ein zentrales Gneissmassiv beim weiteren Vordringen des Tunnels nicht zu rechnen ist.

Der Stollen der Südseite ist auf die ganze Länge von Km. 5,361 bis Km. 5,859 in der gleichen Gesteinsformation geblieben. Es ist der bereits im vorhergehenden Vierteljahresbericht erwähnte feine, sehr schieferige Gneiss, der allmählich in eine fast horizontale Lagerung übergeht.

Die in den neu erstellten Probelöchern gemessenen Gesteinstemperaturen finden sich in der Tabelle II zusammengestellt.

Tabelle II.

| Nordseite-Brieg | | Südseite-Iselle | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Abstand vom Tunnelleingang m | Temperatur des Gesteins °C | Abstand vom Tunnelleingang m | Temperatur des Gesteins °C |
| 7800 | erste Messung | 5200 | erste Messung |
| | letzte » | | letzte » |
| 7900 | erste » | 5400 | erste » |
| | letzte » | | letzte » |
| 8236 | erste » | 5600 | erste » |
| | letzte » | | letzte » |
| — | — | 5800 | erste » |
| | — | | letzte » |

Die unmittelbar beim Vortrieb des Stollens gemachten Erhebungen haben selbstverständlich entsprechend höhere Temperaturen ergeben. So wird im Berichte mitgeteilt, dass in den zwischen 1,20 und 1,50 m tiefen Bohrlöchern der Stollenbrust die Gesteins-Temperaturen auf der Nordseite gemessen wurden bei Km. 7,901 mit 53°C, bei Km. 8,096 mit 54°C, bei

Die Waschanstalt Union in Davos

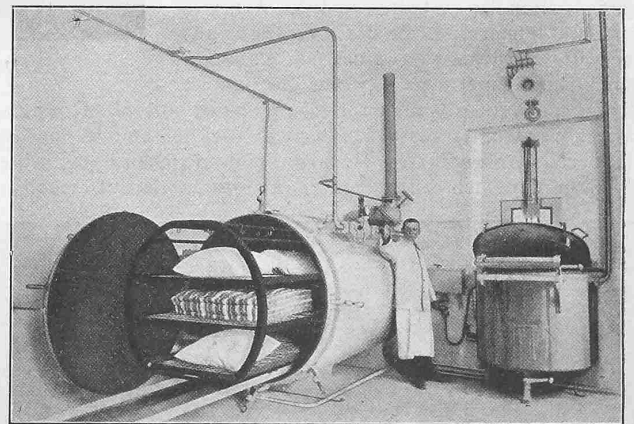


Abb. 13. Der Desinfektionsraum (Desinfizierte Seite).

Km. 8,289 mit 53,4°C, und bei Km. 8,402 mit 53,6°C. Ueber die verhältnismässig rasche Abkühlung des Gesteines geben folgende Aufzeichnungen ein Bild. In dem 41. Querstollen der Nordseite bei Km. 7,900, wo die Gesteinstemperatur ursprünglich d. h. am 2. Okt. 53°C betragen hatte, wurde in dem 1,5 m tiefen Beobachtungsloche gemessen:

| Datum: | Gesteinstemperatur: | Lufttemperatur: |
|----------------|---------------------|-----------------|
| am 17. Oktober | 48,8 °C | 26,0 °C |
| » 1. November | 41,8 » | 26,5 » |
| » 16. » | 38,5 » | 24,0 » |
| » 1. Dezember | 35,9 » | 27,0 » |
| » 16. » | 34,5 » | 23,0 » |
| » 27. » | 33,0 » | 23,0 » |

Die in den bleibenden Stationen gemessenen Temperaturen sind in Tabelle III und IV zusammengestellt. Hierbei ist zu bemerken, dass man wegen des vielen im Nebenstollen der Südseite abfliessenden Wassers genötigt war, vom 1. November 1902 an die Temperatur-Beobachtungsstationen vom Seitenstollen in möglichster Nähe der bisherigen Stationen und in ganz gleicher Anordnung in Nischen des Haupttunnels zu verlegen.

Der Wasserandrang in der auf der Nordseite im Berichtvierteljahr vom Stollen durchfahrenen Strecke ist quantitativ nicht von Belang gewesen. Das von Km. 8,400 an zu Tage tretende Wasser ist besonders stark gipshaltig, es enthält stellenweise über 4 g feste Bestandteile auf einen Liter. Auf der Südseite sind auch, offenbar dank der nahezu horizontalen Schichtung des Gneiss, keine weiteren Quellen angetroffen worden. Die Wasserzuflüsse bei Km. 4,400 haben seit dem September erheblich, um etwa 200 Sek./l, abgenommen. Bei einzelnen Wasseradern ist die Temperatur wesentlich gesunken, während andere grössere Gruppen von Quellen eine konstante Temperatur beibehalten haben und jene im Querstollen XIX ihre Temperatur auf 32,2°C erhöht hat. Dabei ist letztere in 5/4 Jahren auf etwa den vierten Teil ihrer ursprünglichen Wassermenge zurückgegangen.

Die durch die Ventilationsanlage an der Nordseite in den Tunnel II eingeführte Luft hat nach Messungen, die bei Km. 7,300 vorgenommen wurden, im Durchschnitt 2 080 460 m³ in 24 Stunden betragen. Die Luft



Wettbewerb zur Erlangung von Mosaikbildern im Hofe des Landesmuseums in Zürich.

Zweiter Preis «ex aequo». — Verfasser: *Joh. Bossard* aus Zug, in Charlottenburg.

Detailbild aus der Schlacht bei Näfels.

Seite / page

80 (3)

leer / vide /
blank

tritt jetzt durch den Querstollen bei Km. 8,100 aus dem Parallelstollen in den Richtstollen I; ihre Temperatur steigt von 3,6°C auf 25,4°C bei den auf Km. 8,100 aufgestellten Sekundär-Ventilatoren. Durch letztere werden täglich 146800 m³ vor Ort im Richtstollen I und 108860 m³ vor Ort im Parallelstollen befördert. Durch zwei Zerstäuberkühlanlagen bei Km. 5,890 und 7,670 wird die Luft um 4°C + 5°C abgekühlt. Ausserdem ist ein Eiskühler-Wagen in die Leitung der sekundären Ventilation eingeschaltet.

Auf der *Südseite* sind durch den grossen mit 330 minutlichen Umdrehungen laufenden Ventilator im Durchschnitt täglich 2650000 m³ Luft eingeführt worden. Der Uebertritt vom Parallelstollen nach Stollen I erfolgt durch die Traverse bei Km. 5,700. Bis dahin steigt die Lufttemperatur von anfänglich 4,98°C auf 21°C. Von Km. 5,700 aus wurden durch die Sekundärventilatoren täglich 75000 m³ bis vor Ort im Stollen I und 62000 m³ vor Ort in den Parallelstollen gebracht. Beim Austritt hatte die Luft daselbst eine Temperatur von 24,2°C.

An *Druckwasser* wurde auf der Brieger Seite durch die Zentrifugalpumpe 55 Sek./l mit einem Drucke von 21 Atm. auf die Arbeitsplätze befördert; seine Temperatur betrug beim Austritt aus den Bohrmaschinen 11,9 bis 13°C. Den Arbeitsstellen der Iselle Seite wurden 20 Sek./l Druckwasser geliefert, das bei einer Anfangstemperatur von 5,9°C beim Austritt aus den Bohrmaschinen 20°C aufwies.

Tabelle III. Nordseite-Brieg. — Parallelstollen.

| Abstand vom Stolleneingang m | Datum der Messungen | Temperatur °C | |
|------------------------------|---------------------|---------------|----------|
| | | des Gesteins | der Luft |
| 500 | 18. Oktober | 12,5 | 11,0 |
| | 15. November | 10,5 | 8,5 |
| | 24. Dezember | 8,8 | 5,0 |
| 1000 | 18. Oktober | 14,2 | 12,0 |
| | 24. November | 12,4 | 9,5 |
| | 24. Dezember | 11,8 | 8,5 |
| 2000 | 18. Oktober | 17,0 | 15,5 |
| | 15. November | 16,3 | 14,0 |
| | 24. Dezember | 15,5 | 13,0 |
| 3000 | 18. Oktober | 19,6 | 17,5 |
| | 15. November | 19,2 | 17,0 |
| | 24. Dezember | 18,4 | 15,0 |
| 4000 | 18. Oktober | 21,4 | 18,5 |
| | 15. November | 20,2 | 18,5 |
| | 24. Dezember | 19,2 | 17,5 |
| 5000 | 18. Oktober | 23,0 | 20,0 |
| | 15. November | 22,5 | 19,0 |
| | 24. Dezember | 21,6 | 17,0 |
| 6000 | 18. Oktober | 24,8 | 16,0 |
| | 15. November | 24,3 | 15,5 |
| | 24. Dezember | 23,6 | 17,5 |
| 7000 | 18. Oktober | 30,0 | 20,5 |
| | 15. November | 29,6 | 20,0 |
| | 24. Dezember | 28,6 | 19,0 |

Tabelle IV. Südseite-Iselle. — Parallelstollen und Haupttunnel.

| Abstand vom Stolleneingang m | Lage der Station | Datum der Messungen | Temperatur °C | |
|------------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------|
| | | | des Gesteins | der Luft |
| 500 | Parallelstollen | 11. Oktober | 16,0 | 14,2 |
| | Stollen I | 13. November | 20,3 | 22,5 |
| | » | 26. Dezember | 20,3 | 24,0 |
| 1000 | Parallelstollen | 5. Oktober | 17,4 | 14,5 |
| | Stollen I | 13. November | 21,9 | 24,0 |
| | » | 26. Dezember | 21,8 | 24,0 |
| 2000 | Parallelstollen | 11. Oktober | 18,4 | 15,0 |
| | Stollen I | 13. November | 22,9 | 23,0 |
| | » | 26. Dezember | 22,8 | 23,0 |
| 3000 | Parallelstollen | 7. Oktober | 18,5 | 15,0 |
| | Stollen I | 13. November | 22,6 | 21,5 |
| | » | 26. Dezember | 22,7 | 22,0 |
| 4000 | Parallelstollen | 11. Oktober | 22,8 | 15,2 |
| | Stollen I | 13. November | 24,7 | 21,5 |
| | » | 26. Dezember | 24,7 | 21,0 |
| 5000 | Parallelstollen | 11. Oktober | 23,8 | 22,8 |
| | » | 13. November | 23,0 | 20,5 |
| | » | 26. Dezember | 21,3 | 17,8 |

In Tabelle V ist die Temperatur der Luft an den verschiedenen Arbeitsplätzen vor Ort verzeichnet.

Tabelle V.

| Mittlere Temperatur | Nordseite-Brieg | | Südseite-Iselle | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Richtstollen | Parallelstollen | Richtstollen | Parallelstollen |
| Während des Bohrens | 24,6°C | 23,6°C | 28,0°C | 26,8°C |
| Während d. Schutterung | 28,6 » | 27,6 » | 30,0 » | 28,7 » |
| Höchste Temperatur | | | | |
| Während d. Schutterung | 30,5 » | 31,0 » | 31,0 » | 29,0 » |

Bei den Ausmauerungsarbeiten wurden im nördlichen Tunnel 23,5°C bis 28°C, auf der südlichen Seite 24,0°C bis 25°C gemessen.

An *Querstollen* waren bis Ende 1902 auf der *Nordseite* 42 erstellt in einer Gesamtlänge von 609 m, wovon 43,5 m im letzten Quartal gebaut worden sind. Auf der *südlichen* Seite ist die Zahl der Querstollen auf 28 angestiegen mit zusammen 406 m Länge, wovon 29 m im Laufe des Vierteljahres erstellt wurden.

Zu genanntem Zeitpunkt waren an *Ausmauerung* fertig erstellt auf der Brieger Seite die beiden Widerlager mit 7445 m, das Gewölbe mit 7413 m und das Sohlengewölbe mit 526 m Länge, auf der Seite von Iselle die beiden Widerlager auf eine Länge von 4675,5 m, das Gewölbe auf eine solche von 4618 m und vom Sohlengewölbe 23,5 m.

Tabelle VI zeigt die Gesamtleistungen an Mauerwerk zu Beginn und zum Schluss des Berichtsvierteljahres, sowie den in diesem Zeitabschnitt erzielten Fortschritt.

Tabelle VI.

| Bezeichnung der Arbeiten | Nordseite-Brieg | | | Südseite-Iselle | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | Stand Ende Sept. 1902 | Stand Ende Dez. 1902 | Fortschritt | Stand Ende Sept. 1902 | Stand Ende Dez. 1902 | Fortschritt |
| | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |
| Rechtseitiges Widerlager | 15987 | 17152 | 1165 | 9613 | 10849 | 1236 |
| Linkseitiges Widerlager | 13505 | 14622 | 1117 | 10858 | 11919 | 1061 |
| Scheitelgewölbe | 31100 | 33479 | 2379 | 20807 | 22588 | 1781 |
| Sohlengewölbe | 1618 | 1817 | 199 | 131 | 351 | 220 |
| Kanal | 6865 | 7289 | 424 | 3810 | 4684 | 874 |
| Gesamtausmass | 69075 | 74359 | 5284 | 45219 | 50391 | 5172 |

Die tägliche Durchschnittsleistung in diesem Vierteljahre betrug auf der *Nordseite*: an Aushub 286 m³, an Mauerwerk 68 m³, auf der *Südseite*: an Aushub 237 m³, an Mauerwerk 55 m³. An Dynamit sind auf den nördlichen Arbeitsstellen täglich 535 kg, auf den südlichen täglich 485 kg verbraucht worden.

Von den auf der Brieger Seite vorgekommenen 68 Unfällen hatten zwei einen tödlichen Ausgang. Auf der Seite von Iselle wurden 101 Unfälle gemeldet, die jedoch alle leichter Natur waren.

Miscellanea.

Ausnützung der Wasserkräfte der Isar für die Stadtgemeinde München.

Ueber ein im Norden der Stadt München zu erbauendes Elektrizitätswerk zur Ausnützung der Wasserkräfte der Isar hat *Baurat Uppenborn* ein umfassendes Projekt ausgearbeitet, das demnächst der Beschlussfassung der Gemeinde vorgelegt werden soll und dessen Ausführung namentlich im Interesse des die Motorenkraft benützenden Kleingewerbes zu begrüssen ist. — Die Anlage, die bereits im Jahre 1897 in dem Projekt über die zu erbauenden Elektrizitätswerke in Aussicht genommen war, bisher aber wegen der Schwierigkeiten des Grunderwerbes verzögert wurde, zerfällt in zwei Teile: in einen *wasserbautechnischen Teil*, zu dessen Ausarbeitung der auf hydrotechnischem Gebiete bekannte Zivilingenieur *Telorac* in Kempten zugezogen wurde, und in einen *maschinellen und elektrischen Teil*.

Die Wehranlage der Wasserfassung weist sieben Schleusen und ein festes Ueberfallwehr auf. Zwischen Schleusenwehr und Ueberfallwehr ist noch eine Flossgasse und eine Fischleiter vorgesehen. Die Gesamtbreite der Wehranlage von Ufer zu Ufer beträgt 127,4 m, wozu eine Verbreiterung des Flussbettes unterhalb des Wehres auf eine Länge von 220 m, oberhalb auf eine solche von 250 m nötig werden wird, damit die von der Staatsbehörde gestellte Bedingung des ungestauten Abflusses eines ausserordentlichen Hochwassers erfüllt werden kann. Zur Vermeidung von Betriebsstörungen in der Flossfahrt ist geplant bei kleinen Wasserständen die Flösse durch den Kanal zu leiten. Zu diesem Zwecke ist oberhalb der Einlassschleuse eine besondere Flosseinfahrt projektiert, deren Abschluss durch eine Torschleuse bewerkstelligt wird. Die gesamte Wehranlage wird aus Beton erstellt, die Schleusenwerke in Eisenkonstruktion. Die Schleusen sollen in der Regel auf elektrischem Wege bedient werden. Der Werkkanal ist grösstenteils mit Erdböschungen ohne besondere Befestigung auszuführen. Während 207 Tagen stehen für die neue Wasserkraftanlage
